



**EXPEDIENTE:** 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
**RECURRENTE:** [REDACTED]  
**SUJETO OBLIGADO:** AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**PONENTE:** ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

*00613/ECATEPEC/IP/A/2010, ingresada en fecha precedente, a través del SISTEMA DE CONTROL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO; me permito anexar al presente, copias digitalizadas de la bitácora que refiere en su amable solicitud...*

4. El diecisiete de enero de dos mil once, **EL RECURRENTE** interpuso recurso de revisión, mismo que **EL SICOSIEM** registró con el número de expediente **00040/INFOEM/IP/RR/2011**, donde señaló coincidentemente como acto impugnado y motivos de lo inconformidad, lo siguiente:

*"...No me entregaron el documento que solicite..."*

5. El veinte de enero de dos mil once, **EL SUJETO OBLIGADO** rindió Informe Justificado para manifestar lo que a su derecho le asiste en relación con el presente recurso de revisión, en el siguiente sentido:

*"...La información fue entregada al particular en los términos solicitados sin embargo con motivo del recurso de revisión se revisó y al no encontrarse el archivo dentro del sistema se envió nuevamente al particular al correo electrónico que indico en su solicitud.*

*Correo el cual envió copia a usted con la comprobación de la entrega de dicho documento.*

*De esta manera el H. Ayuntamiento de Ecatepec no actúa de mala fe ni tampoco niega la información; solicitando de la manera más respetuosa se declare la improcedencia del recurso de revisión..."*

Al informe justificado se adjuntó el archivo electrónico **00614ECATEPEC0090660300014946.pdf**, que al ser consultado reprodujo ochenta y seis imágenes correspondientes a cuarenta y tres copias digitalizadas, relativas a la bitácora relacionada con la "Construcción del Puente Peatonal con Rampas en Avenida Vía Morelos, frente a la Clínica No. 68", que fue el objeto del Contrato de Obra Pública sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado **MEM/DOP-31/LPN/FISM-06/2006**.

6. El recurso en que se actúa fue remitido electrónicamente a este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, siendo turnado a través de **EL SICOSIEM** al Comisionado **ARCADIO ALBERTO SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE** a efecto de que formulara y presentara el proyecto de resolución correspondiente; y

## **CONSIDERANDO**

I. Este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 párrafo doce, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 56, 60 fracción VII y 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.





EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:

[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM/009-31/LPN/FSM-06/2006

Nota No. 1

22/NOVIEMBRE/2006

CON LA PRESENTE PAGA EL AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS COMUNICANDO EN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO EN SU TITULO PRIMERO ARTICULO 133 FRACCIONES IV Y EN CUMPLIMIENTO AL TITULO SEXTO SECCION SEGUNDA ARTICULO 123, 223, 224, 225 y 226 DEL MISMO REGLAMENTO SE DA ABERTURA A LA PRESENTE CITACIÒN CORRESPONDIENTE A LA OBRAS DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CON RAMPA EN AVENIDA VIA MORELOS FRENTE A LA CLINICA No. 66" DE LA CIUDAD: SANTA MARIA TULPETLAC LA CUAL SERA FINANCIADA CON RECURSOS DEL RANCO 23 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006, AMPARADO BAJO EL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS No MEM/009-31/LPN/FSM-06/2006, E IDENTIFICADA CON EL No. DE OBRAS 034/2006/FSM/0027, ESTABALECIENDO UN PLAZO DE EJECUCION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2006 AL DIA DE FEBRERO DE 2007, POR LO QUE SE HAN ENCARGADO LOS TRABAJOS A LA EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SORRELO S.A. DE CV. REPRESENTADO POR EL ABOG. ERNESTO ORTIZ ROMERO EN SU CARACTER DE ABOGADO LEGAL, QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR COTEJANDO LOS DATOS Y FOTOGRAFIA QUE EN ELLA SE PLASMA E INFORMA EL SIGUIENTE SONIDO EN: VIRADUCTO LA OBRAS ALIADO No. 337 Cd. La Cruz y PARA OBRAS Y REGISTRO NOTIFICACIONES EN: CENTONILES No. 63 OBRAS HABITACIONAL MORELOS, 2ª SECCION TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO RFC: CLE 810330654.

SIENDO LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS LOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN DE REALIZARA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CON RAMPA EN AVENIDA VIA MORELOS FRENTE A LA CLINICA No. 66 DE LA CAL. SANTA MARIA TULPETLAC CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, PINTURA Y LIMPIEZA; ADARANDO QUE DEL LADO DE LA CLINICA No. 66 OBRAS CON 3 RAMPA (LADO PONIENTE) Y DEL LADO ORIENTE CON 2 RAMPA SEGUN PROYECTO. →

EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: XXXXXXXXXX  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MAN/DOP-3/LAN/ESM-06/2006 ~~ARCADIO~~


000002

ASI MISMO SE ESTABLECEN LAS PARTES INVOLUCRADAS Y PERSONAL  
AUTORIZADA PARA LA UTILIZACION DE ESTA CITACION

POR EL H. AYUNTAMIENTO

~~Por el H. Ayuntamiento~~

ARR. JESUS ROYAS PEREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

  
ING. MIGUEL ANGEL PEREZ CMO.  
(JEFE DE OBRAS ZONA I)

~~Ing. Oscar Lopez Hernandez~~  
ING. OSCAR LOPEZ HERNANDEZ  
(RESIDENTE DE OBRAS)

~~Ing. Rigoberto Santiago Negrete~~  
ING. RIGOBERTO SANTIAGO NEGRETE  
SUPERVISOR DE OBRAS

POR LA CONTRATISTA.

  
ING. AURELIO PINOS MORAGO  
SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCION

~~Ing. Andres Vazquez Romero~~  
ANDRES VAZQUEZ ROMERO  
ANDRES VAZQUEZ ROMERO

EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: XXXXXXXXXX  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

HEM/000-31/L.P.M./FISM-06/2006

~~000003~~

Nota No. 2

22/ DICIEMBRE/ 2006

~~000003~~

CON ESTA FECHA SE SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE EL HORARIO PARA NOTAS DE ALTACORA EN CAMPO SERA DE LAS 8:00 A LAS 18:00 HRS TENIENDO COMO PLAZO MAXIMO PARA LA FIRMA DE DICHAS NOTAS 48 HRS. EN EL ENTENDIDO QUE JERARCA EL MISMO, SE ENTENDERÁ POR ACEPTADO QUEDANDO PROMISORIO LA MODIFICACION DE NOTAS Y SOBRE TODO LAS YA FIRMADAS.



Nota No. 3.

22/ DICIEMBRE/ 2006

CON ESTA FECHA SE SE INFORMA A LA CONTRATISTA RESPECTO A LOS VOLUMENES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, ESTOS SE TOMARAN EN CUENTA PARA EFECTO DE PAGO SIEMPRE Y CUANDO SEAN PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRAS O SUPERVISION EN LA NOTA DE ALTACORA Y CON LA DEBIDA ANTICIPACION.


EN CUANTO A LA REVISION Y AUTORIZACION DE NUMEROS GENERADORES, ESTA SE REALIZARA NECESARIAMENTE EN EL SITIO DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA PARA SU PAGO UNICAMENTE AQUELLOS TRABAJOS O CONCEPTOS DE OBRA CONCLUIDOS AL 100% Y LAS FOTOGRAFIAS QUE SOBORTEN ESTOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y SERAN POR CADA UNO DE LOS MISMOS POR CONSIGUIENTE LAS ESTIMACIONES SE PRESENTARAN EN ORIGINAL Y DOS COPIAS.



**EXPEDIENTE:** 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
**RECURRENTE:** [REDACTED]  
**SUJETO OBLIGADO:** AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**PONENTE:** ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

HGH/000-31/L.O.M./FISH-06/2006 000001  
 Nota No. 4 22/DICIEMBRE/2006 000002

CON LA PRESENTE FECHA SE LE ASIGNA LA DISPOSICIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS A LA CONTRATISTA PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN. ASÍ MISMO SE REALIZA UN RECORRIDO Y SE OBSERVA QUE EXISTEN SUCTOS DE: MAXIGAS Y TELMAX EN AMBOS LADOS POR LO MISMO SE LE INFORMARA VIA OFICIO A DICHAS EMPRESAS PARA SU CONOCIMIENTO.

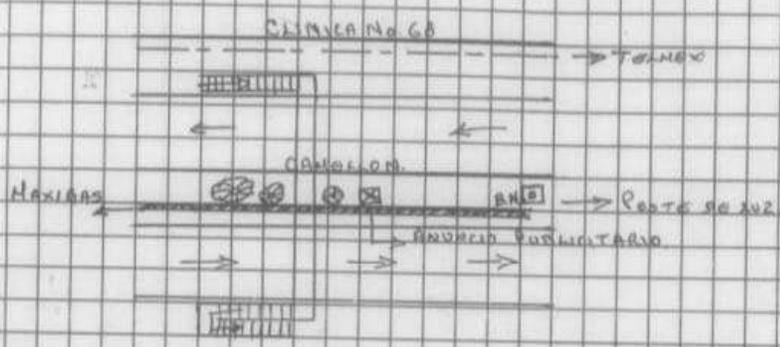

Nota No. 5 22/DICIEMBRE/2006

CON LA PRESENTE FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA QUE LA FECHA NO SE CUENTA CON EL AVANCE CORRESPONDIENTE A LA OBRERA MENCIONADA POR LO CUAL NO HANOS INICIADO LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRERA.

**EXPEDIENTE:** 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
**RECURRENTE:** [REDACTED]  
**SUJETO OBLIGADO:** AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**PONENTE:** ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEX/000-31/2011-06/2006 000005


NOTA No. 6 000005

CON ESTA FECHA SE LE INDIARÁ A LA SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA MENCIONADA POR LO MISMO NO SE HA INICIADO CON LOS TRABAJOS DE DICHA OBRA.




NOTA No. 7 FEBRERO/2007

CON LA PRESENTE FECHA SE INICIA LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ELECTRONICO A DESTACION TOTAL PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA SEGUN PROYECTO DEL LADO DE LA CLINICA SERA A BASE DE 3 RAMPAS Y EL LADO OPUESTO SOLO 2. ASIMISMO LA EMPRESA INICIA CON RECUCOS PROPIOS YA QUE A LA FECHA NO CUENTA CON ANTICIPO.

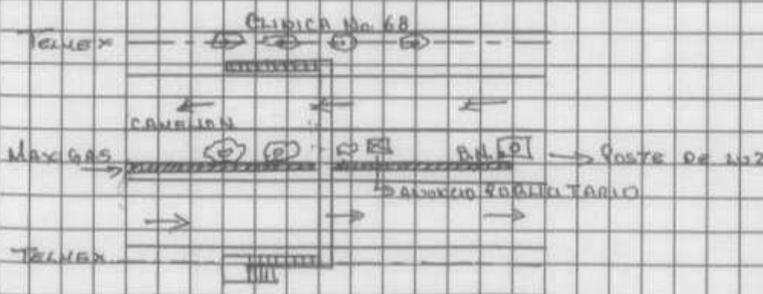

CONTINUA →

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:


[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

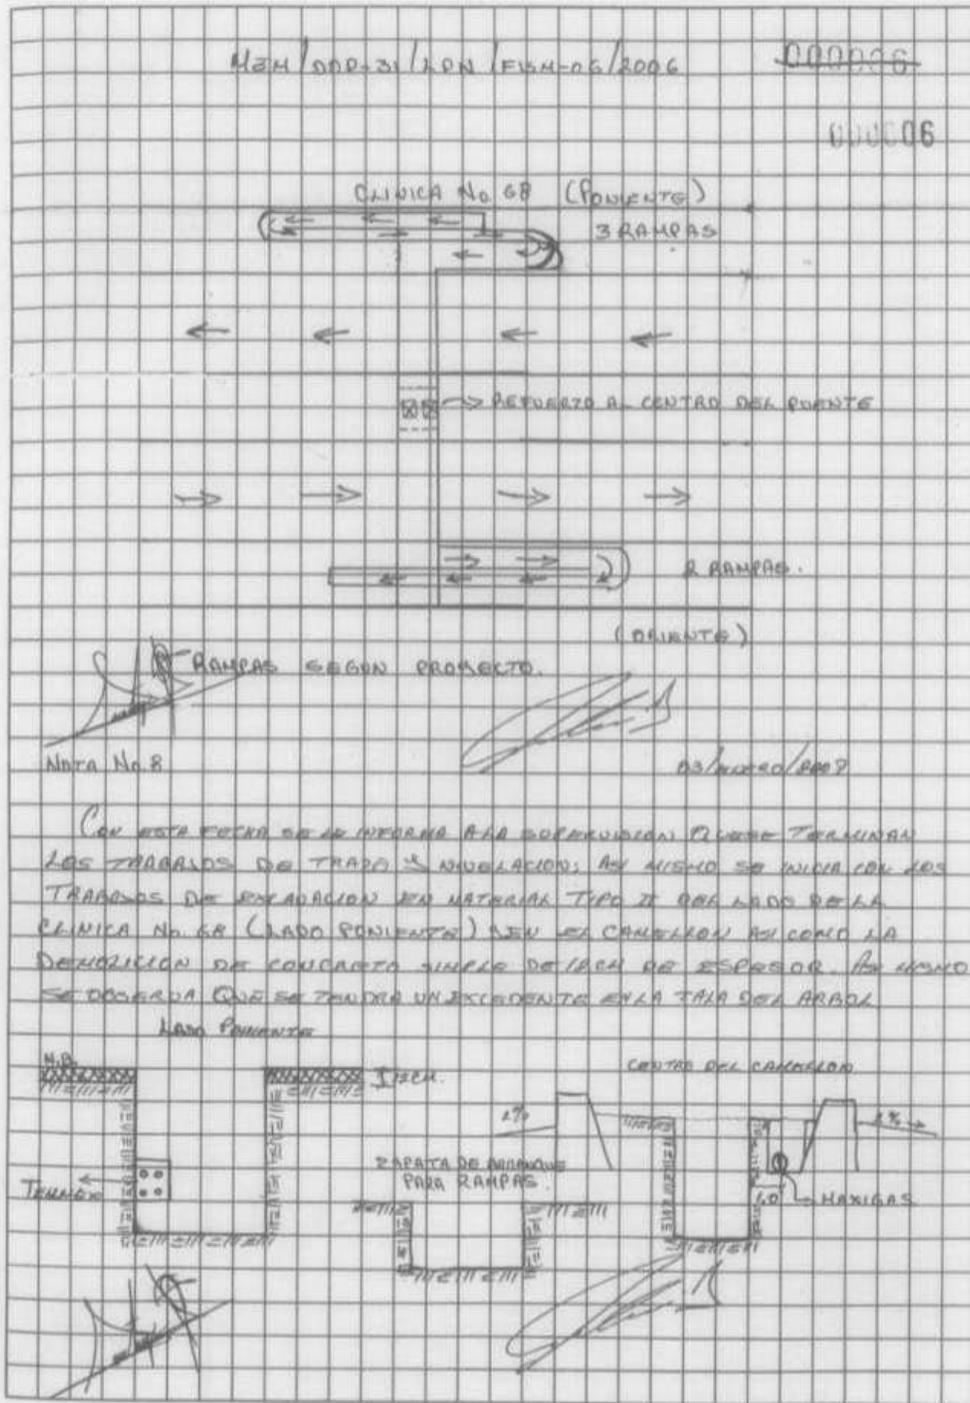

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:

[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS


PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM/DOP-31/L.P.N./FISH-06/2006 000007

Nota No. 9 8/ENERO/2007

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE COMO SE TRABAJARA DEL LADO DE LA CLINICA No. 68 (LADO OCCIDENTE) YA QUE EL LADO ORIENTE SE TIENE UN PROBLEMA CON LOS LOCATORIOS ALEGANDO QUE EL AREA DONDE SE ENCUENTRA EL PUENTE Y DONDE SE CONSTRUIRA LAS NUEVAS CAMPOS ES PROPIEDAD PRIVADA, POR LO CUAL SE RECOMENDARA A LA JUNTA DE CAMINOS PARA QUE REALICEN UN DESLINDE Y ASI EJECUTAR EL PROYECTO DE DICHO PUENTE. ASI MISMO MAXIMOS NOTICHE INCONVENIENTE EN LA CONSTRUCCION DE ZAPATAS EN EL CANTONAMIENTO QUE SUS DOCTOS PASAN A UNA DISTANCIA DE 1.0 MTS. DEPENDIENDO DE LOS




EXCAVACION PARA ZAPATAS AL CENTRO DEL PUENTE

Nota No. 10 8/ENERO/2007

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA COLOCA SUS SEÑALAMIENTOS:

- 1- CONOS DE 45CM COLOR NARANJA DE BASE 30x30 CM.
- 2- SEÑAL PREVENTIVO HOMERES TRABAJANDO O REDUCCION DE CARRIL.
- 3- SEÑALAMIENTO NOCTURNO DEL AREA DE EXCAVACION CON LAMPARAS EN CORDA ROJO (CUBIERTAS) COLOCADAS UNA LAMPARA POR 70 CM
- 4- CINTA PLASTICA DE PROTECCION COLOR AMARILLO.
- 5- TALA DE ARBOL Y EXTRACCION DE TRONCO




○ Conos de 45cm

● SEÑALAMIENTO NOCTURNO

■ HOMERES TRABAJANDO

— HOMERES TRABAJANDO

○ ARBOL




EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:


[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:


AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

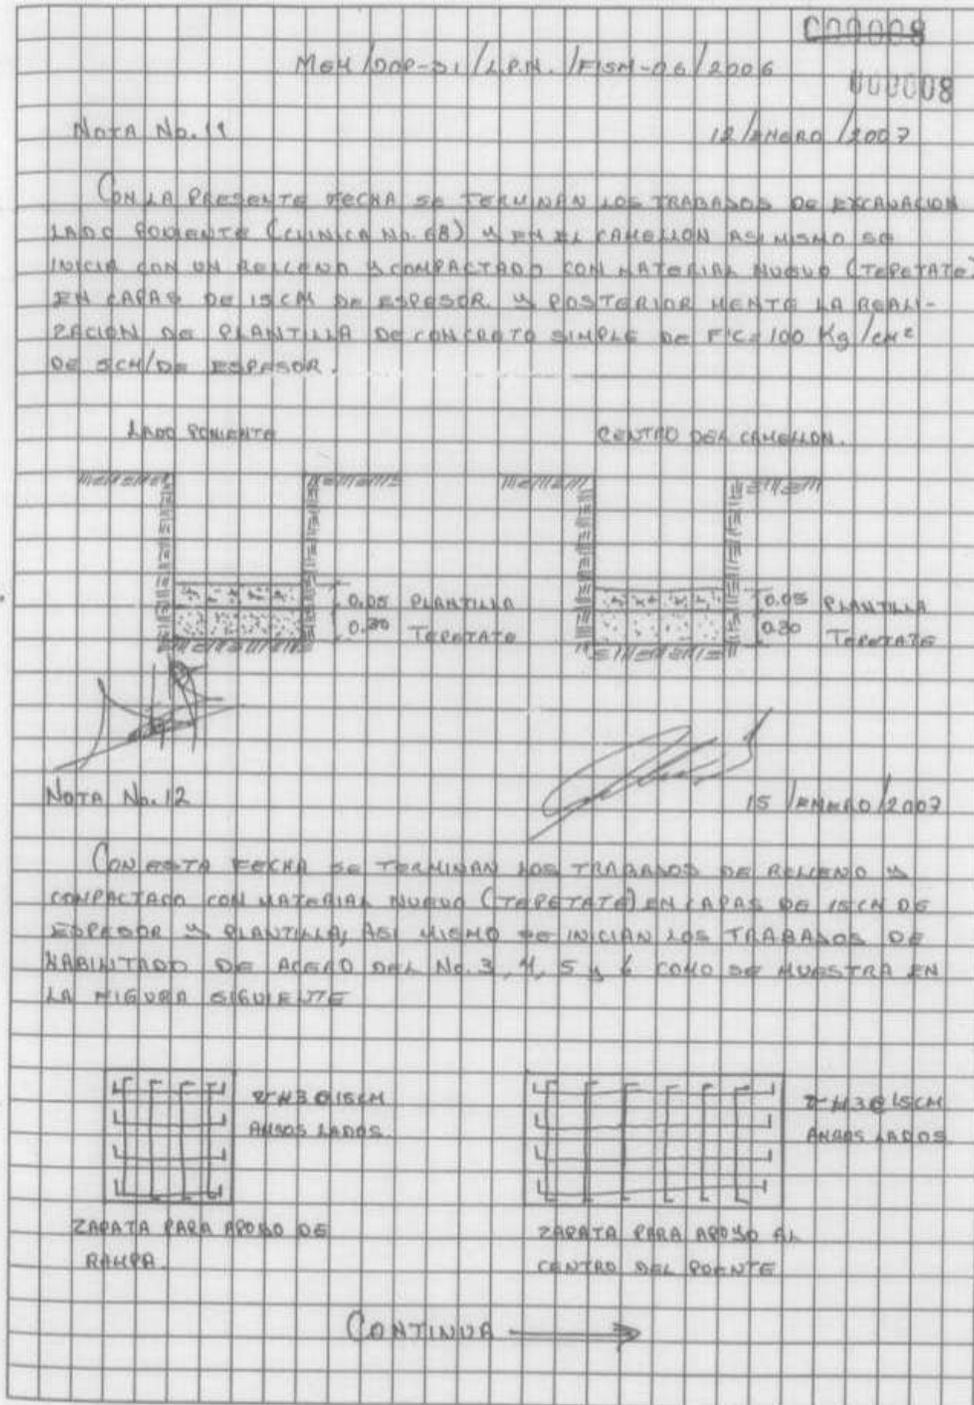

**EXPEDIENTE:** 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
**RECURRENTE:** XXXXXXXXXX  
**SUJETO OBLIGADO:** AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**PONENTE:** ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

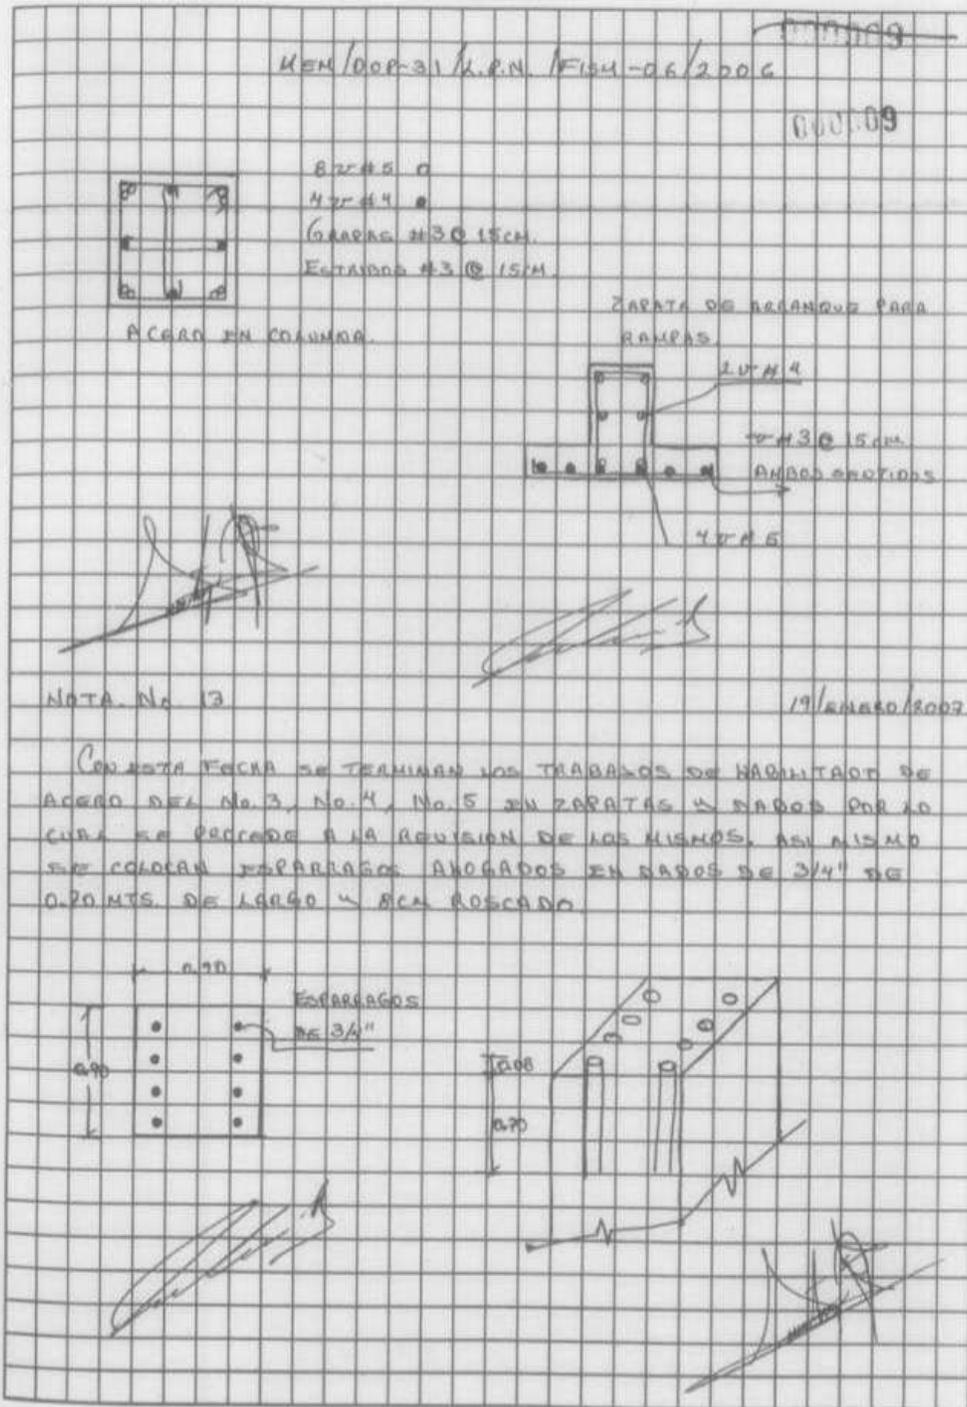

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:


[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

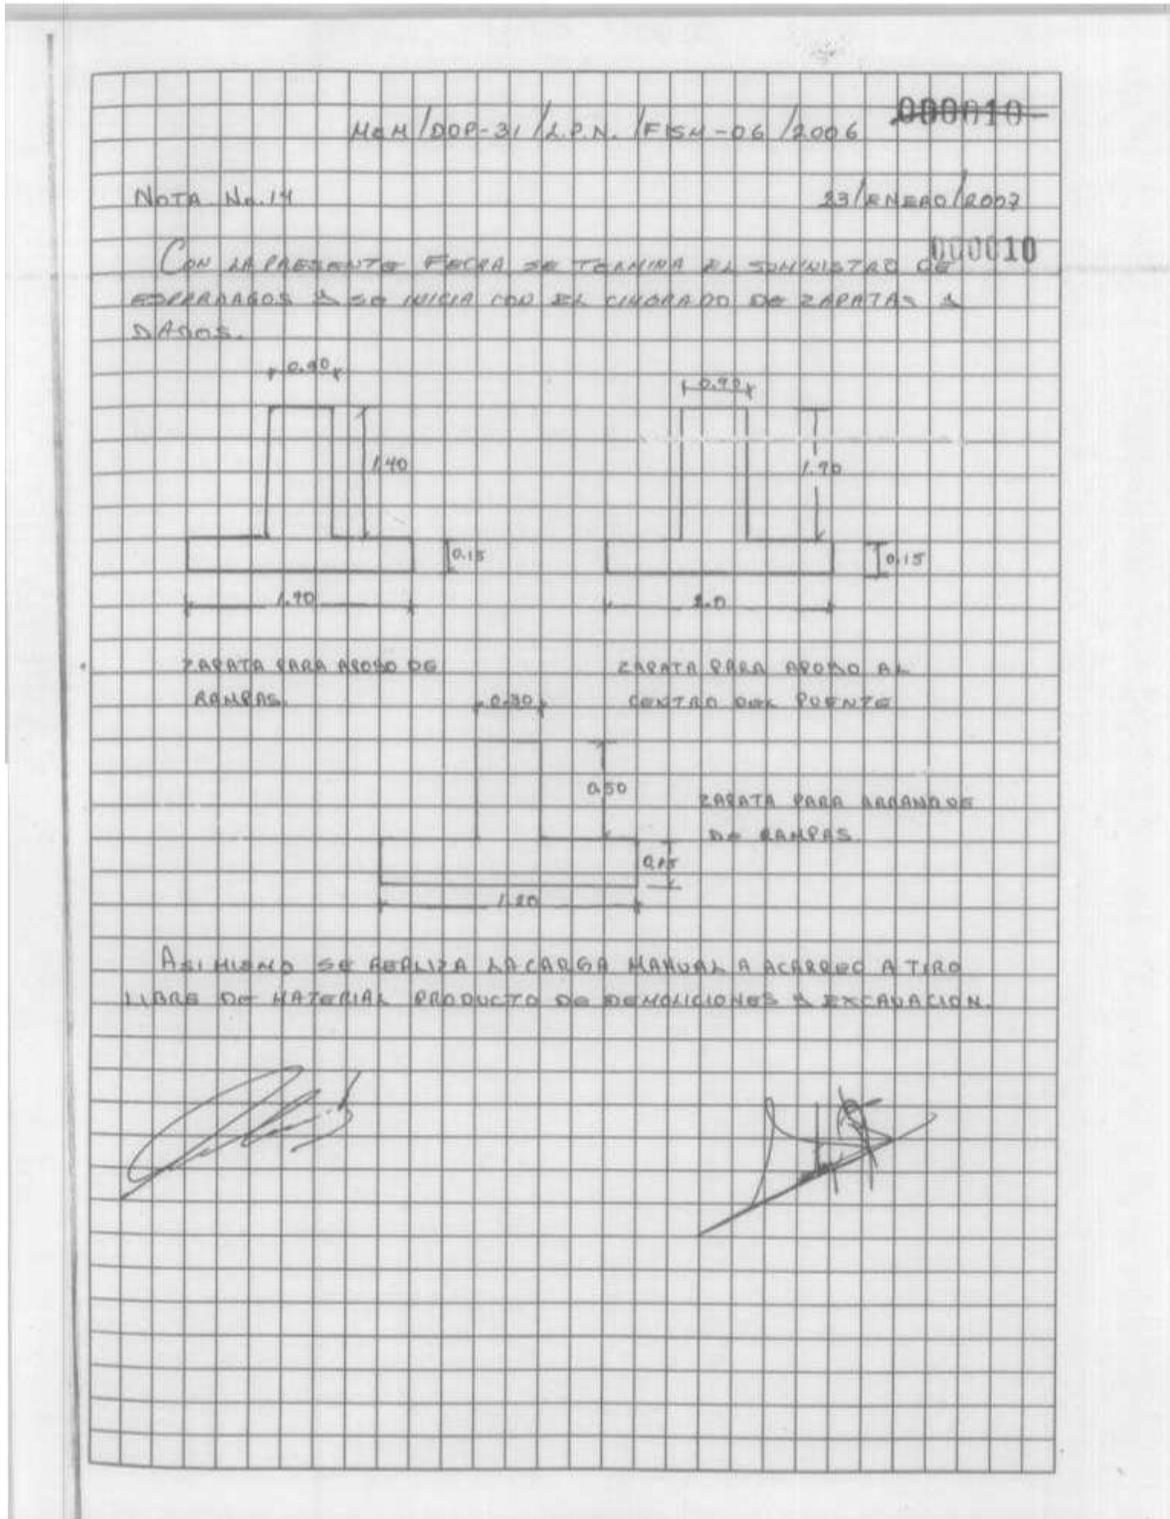

EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
 RECURRENTE: XXXXXXXXXX  
 SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
 PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

HEN/008-31 / L.P.N. / F. 34-06/2006

NOTA. No. 15 26/ENERO/2007


CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION ~~Y DESDE AHORA~~ QUE AUNQUE NO SE CUENTA CON EL ANTIQUEO CORRESPONDIENTE A LA OBRA POR LO QUE LA FUERZA DE TRABAJO ES MÍNIMA, DEL MISMO NO SE CUENTA CON UNA RESPUESTA SOBRE LA LIBERACION DEL ESPACIO DEL LADO ORIENTE.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NOTA. No. 16 31/ENERO/2007

CON LA PRESENTE FECHA UNA VEZ MAS REVISADO LA CALIDAD DEL ACERO, ESPARSAOS Y CIMENTADO DE ZAPATAS Y DADOS SE AUTORIZA EL ADMINISTRO DE CONCRETO CON UN  $f'_{c} = 250 \text{ Kg/cm}^2$  R.N. T.M.A. DE 1944 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA.

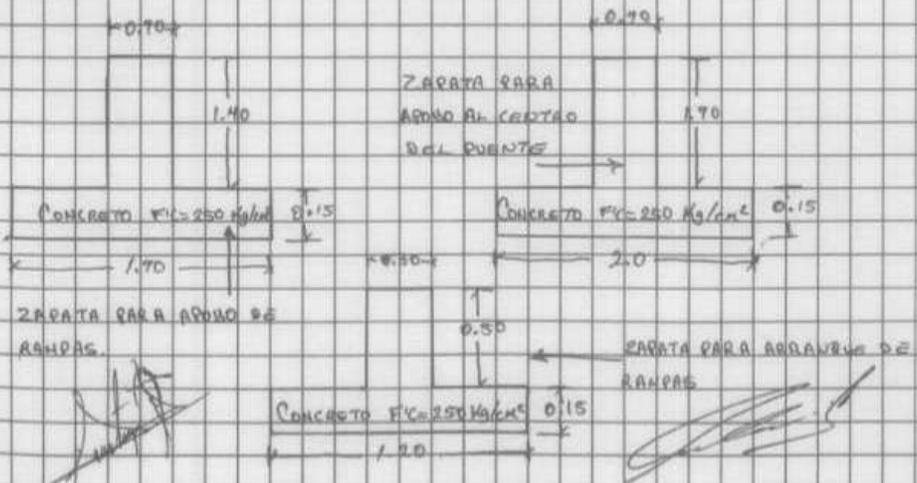

EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: XXXXXXXXXX  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

000112

NOR/2007-31/LRA/FIEM-06/2006


NOTA No. 17 02/Febrero/2007

CON ESTA FECHA SE LA INFORMA A LA SUPERVISION Y DEPENDENCIA QUE AL DIA PROXIMO 4 DE FEBRERO DE 2007 SE VENCE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEGUN CONTRATO Y QUE AUN NO SE CUENTA CON EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AUNADO QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS.

NOTA No. 18 07/Febrero/2007

CON LA PRESENTE FECHA UNA VEZ COLADO DADOS Y ZAPATAS DE PARED A DESEMBAJADO DE LAS MISMAS PARA ALCANZAR SU RESISTENCIA MAXIMA.

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:


[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

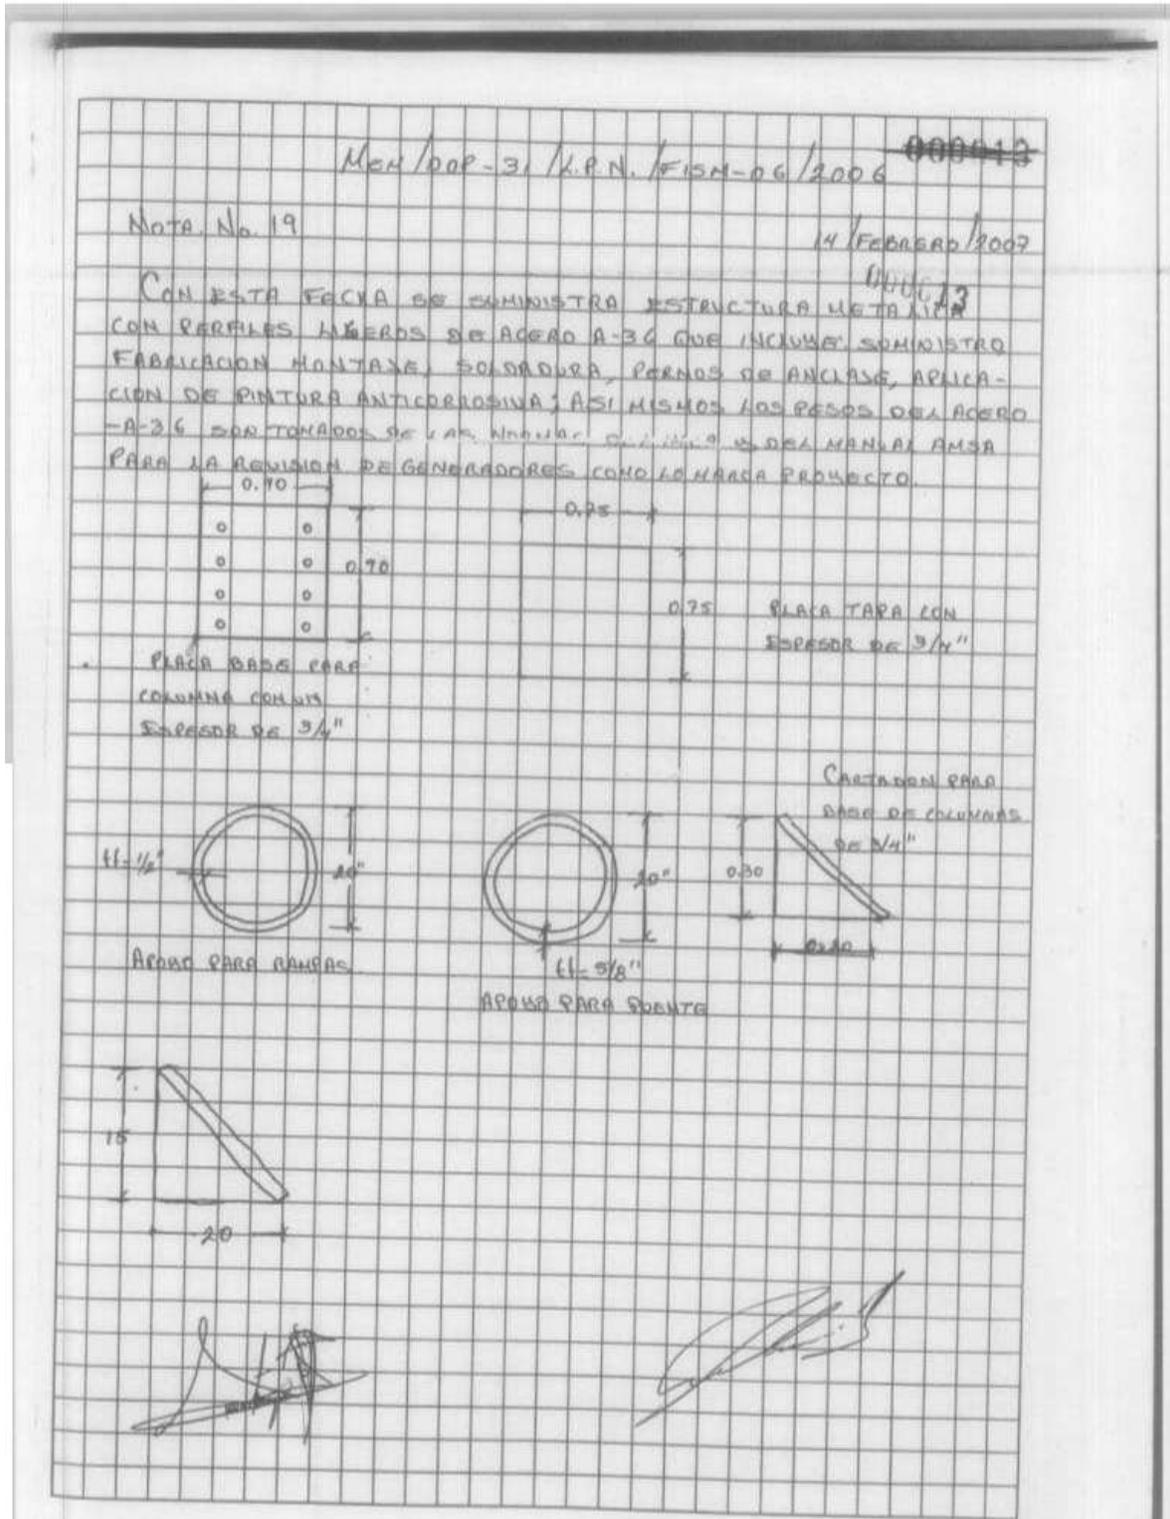

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:

[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

000014  
000014  
21/FEBRERO/2007

MEM/DOP-31/L.P.N. /FISA-06/2006

Nota. No. 20

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA NO CUENTA CON EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRAS, AVANZO CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA A-36, ASI MISMO REALIZA EL RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL.

Nota. No. 21

CON LA PRESENTE FECHA UNA VEZ TERMINADO DE SUMINISTRAR Y HABILITAR LA ESTRUCTURA PARA ARCO AL CENTRO DEL PUENTE Y ARCO PARA RAMPA SE PROCEDE A LA COLOCACION.

CONTINUA →

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:


[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

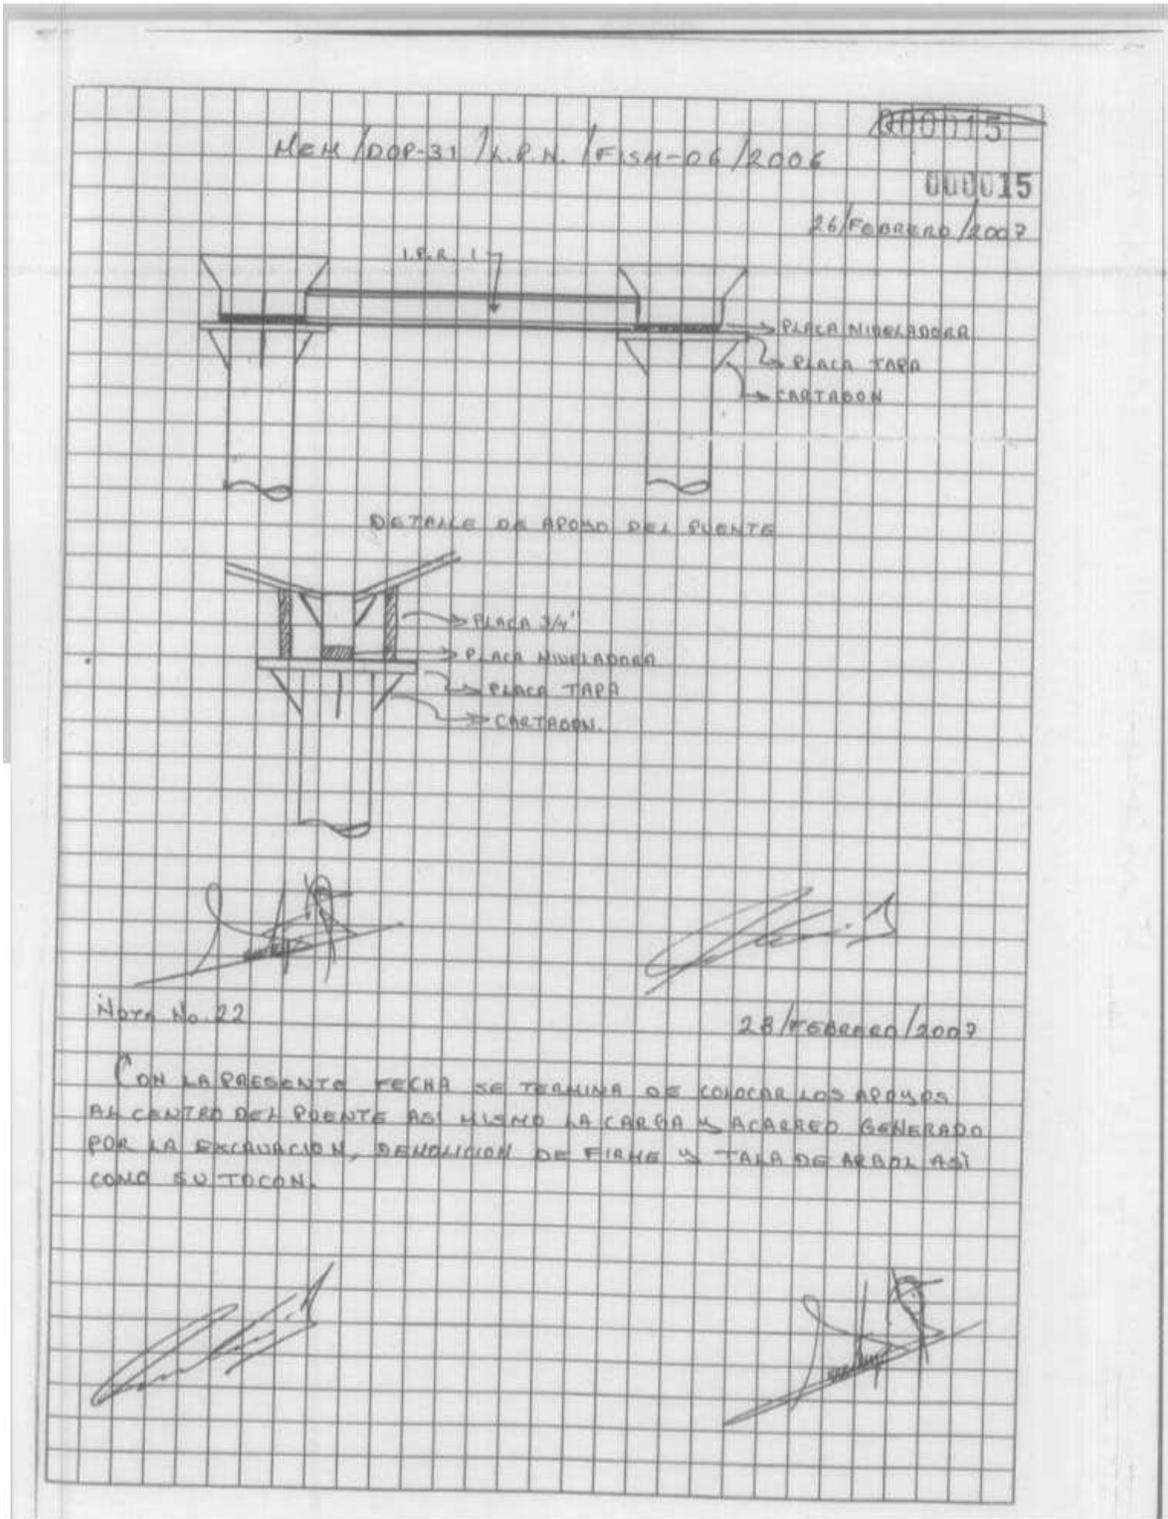

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:

[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM/DOP-31/L.P.N. FS4-06/2006

000115

NOTA No. 23

01/MARZO/2007

000116



CON LA PRESENTE FECHA UNA VEZ REVISADO SU PETICION DE DIFERIMIENTO POR ATRAZO DEL ANTICIPO SE LE AUTORIZA UN NUEVO PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS QUE DANDO DEL: 01/MARZO/2007 AL 14 DE ABRIL DE 2007 45 DIAS CALENDARIO.



NOTA No. 24

06/MARZO/2007

CON ESTA FECHA SE SUMINISTRA ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES HUECOS DE ACERO A-36 SEGUN PROYECTO. IR-1 = 12" IR-2 = 8" IR-3 = 6" PARA EL ARMADO DE LA RAMPA LADO PONIENTE (CLINICA No. 68).

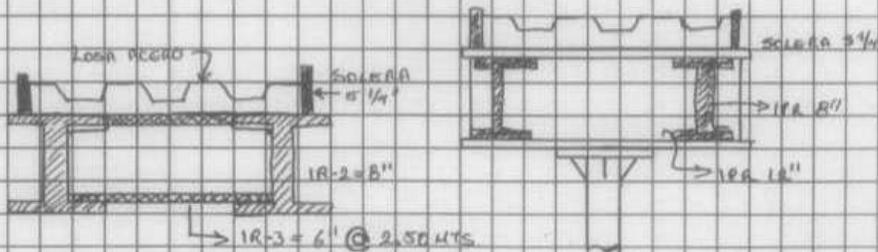

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:

[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM / ODP-31 / L.P.N. / FISH-06 / 2006 ~~SECRET~~

Nota No. 25

12/MARZO/2007


CON LA PRESENTE FECHA SE INFORMA QUE AUNQUE LA VENTA DE CAMINOS NO HA RESUELTO EL PROBLEMA CON EL DESLINDE, ASÍ MISMO SE LE PRESENTARÁN PROPUESTAS A LOS LOCATARIOS YA QUE LA RAMPA DE BÓN PROYECTO OBSTACULIZA EL ACCESO DE MUCHOS LOCALES ASÍ COMO VISIBILIDAD EN SUS ANUNCIOS POR LO MISMO LA EMPRESA SOLA TRABAJARÁ EN EL LADO PONIENTE (CLÍNICA No. 68).



Nota No. 26

20/MARZO/2007

CON LA PRESENTE FECHA LA EMPRESA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE HABILITADO DE ESTRUCTURA METÁLICA CON PERFILES LIGEROS DE ACERO A-36, LADO PONIENTE (CLÍNICA No. 68) ASÍ MISMO SE LE ENVIA VIA OFICIO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EL APROBADO PARA EL MOVIMIENTO DE UN POSTE DE ALTA TENSION QUE OBSTACULIZA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS RAMPAS.



EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:


[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

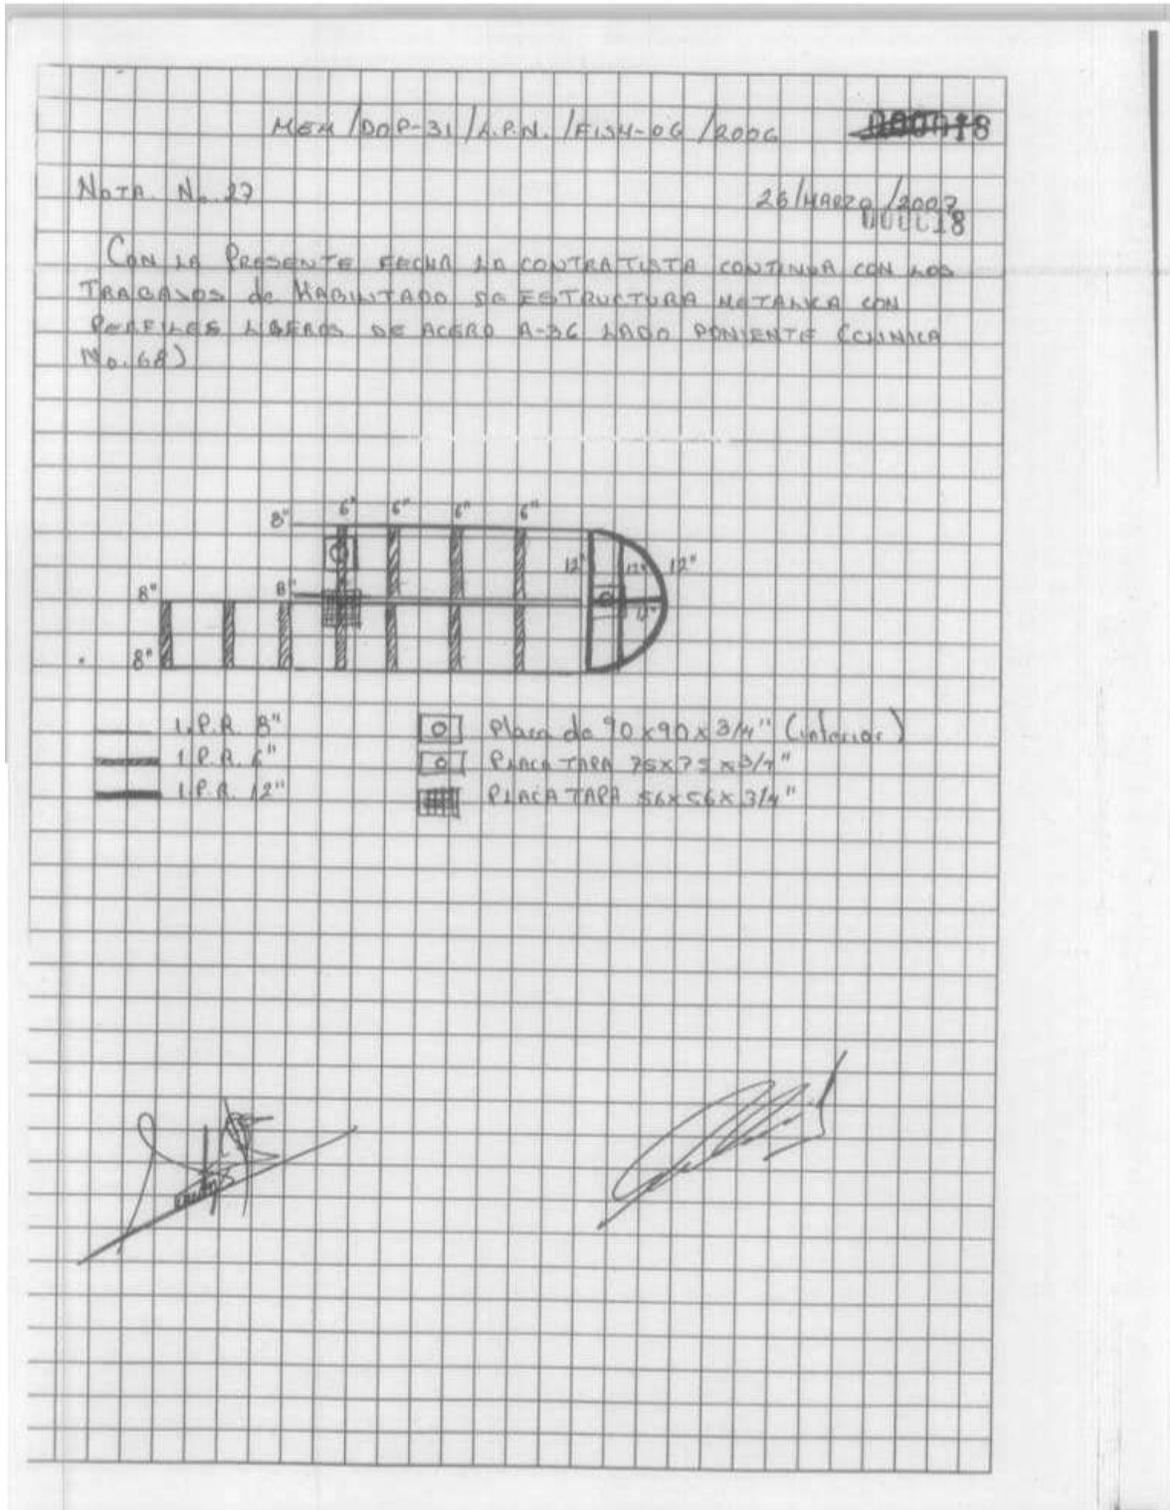

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011


RECURRENTE:

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

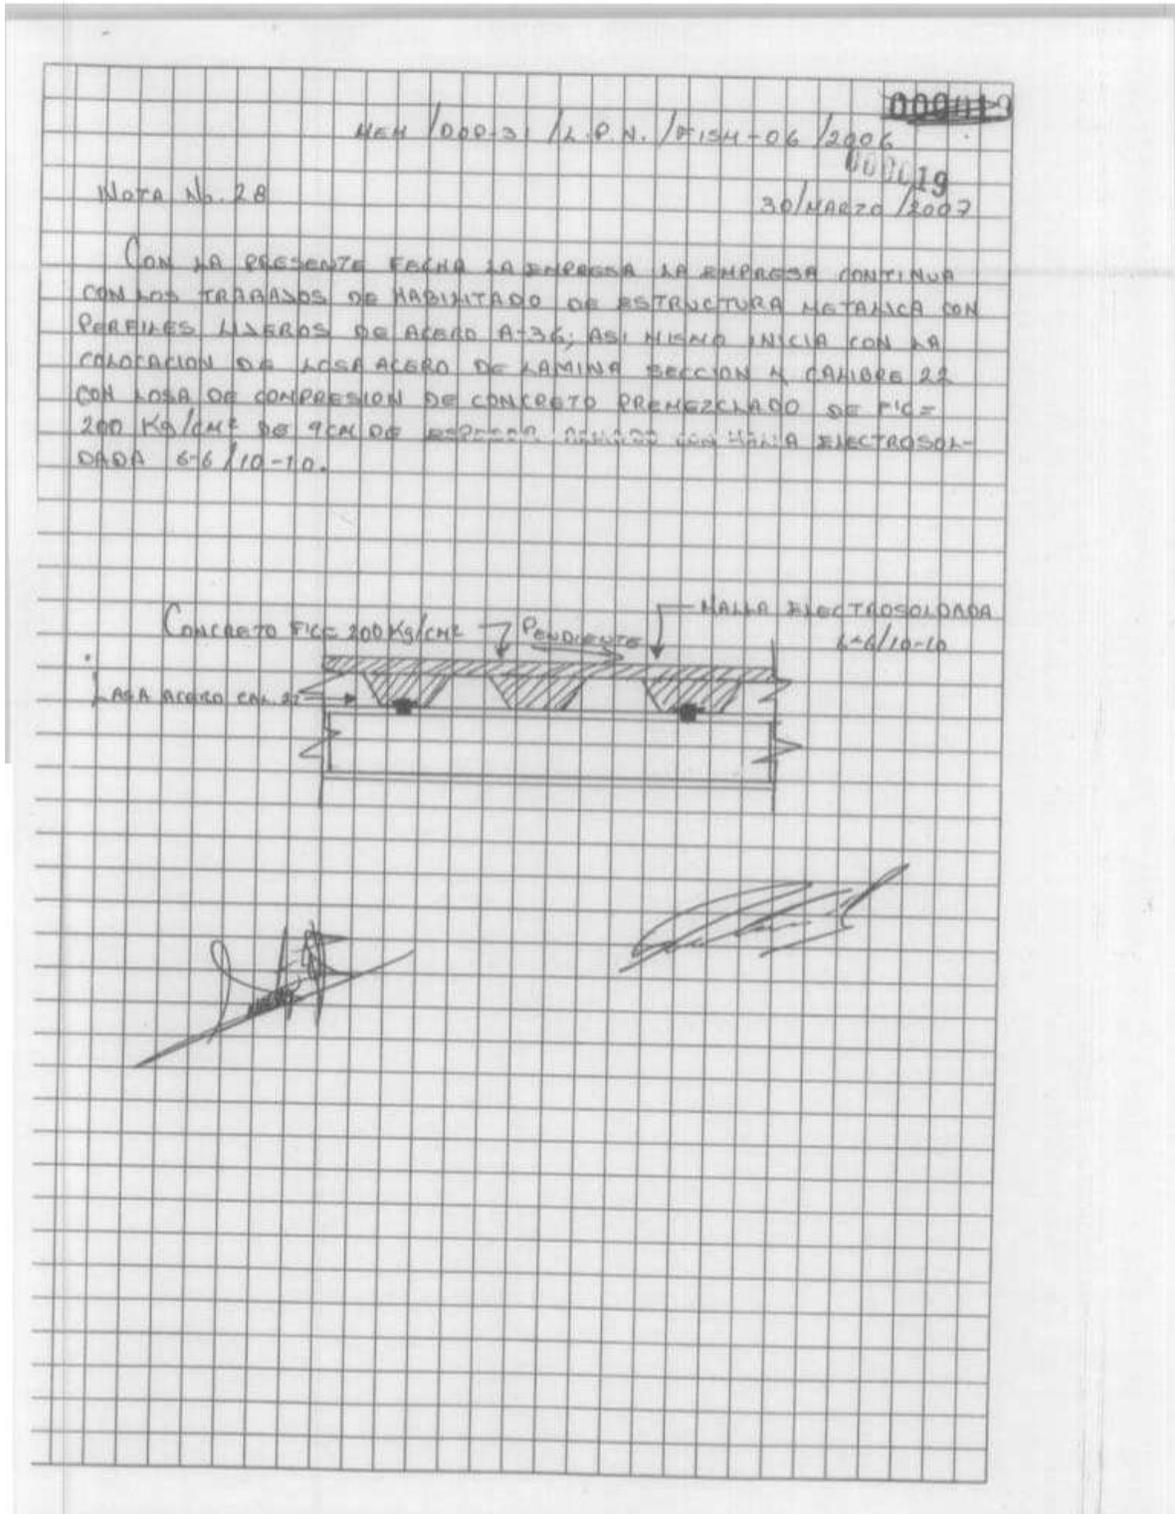




EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: XXXXXXXXXX  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

000421

MEM/DOP-31/L.R.N./FISH-06/2006

NOTA No. 30 04/AGOS/2007


CON LA PRESENTE FECHA SE SOLICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA HAGA LLEGAR SUS GENERADORES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. 000421

NOTA No. 31 09/ABRIL/2007

POR MEDIO DE ESTA NOTA SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS TEMPORALMENTE DEBIDO A LOS PROBLEMAS QUE SE HAN SUCITADO A LO LARGO DE LA MISMA LA ANTERIOR DE ACUERDO AL OFICIO CON NUM: SOP/1041/000/355/2007 POR LOS MOTIVOS DE:

LOCATARIOS DEL LADO ORIENTE NO PERMITEN LA CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS ARGUMENTANDO QUE LA JUNTA DE CAMINOS NO LOS INDEMNIZO POR LA UTILIZACION DE AREAS DE SU PROPIEDAD DESDE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ANTERIOR ALLEGANDO QUE SUS PREDIOS ABARCAN HASTA LA GUARNICION Y BANQUETA.

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:

[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

Mem/OP-31/LEN/ELSA-06/2006 000022

Nota No. 32 06/FEB/08

CON LA PRESENTE FECHA EN REFERENCIA AL DICTAMEN 1122  
TECNICO SON DE SE MANIFIESTA LOS MOTIVOS Y LOS  
OFICIOS GIRADOS A DEPENDENCIAS EXTERNAS EL  
DIA DE HOY SE REALIZA UN CONVENIO POR AMPLIA-  
CION DE PLAZO CON NO. DE OFICIO S/DG/309-C/SOC/136-C/2008  
QUE DADA EL SIGUIENTE PERIODO DEL 06/FEB/08 AL  
21/MARZO/2008 UNA VEZ QUE SE CUENTA CON EL OFICIO  
DE LA JUNTA DE CAMINOS MANIFESTANDO QUE NO  
TIENE INCONVENIENTE EN QUE SE LLEVEN A CABO  
LOS TRABAJOS QUE SE TIENEN PROGRAMADO SIEMPRE Y  
CUANDO SEA DENTRO DE LA FRANJA DE LOS 40.00MTS  
DE DERECHO DE VIA.

[Signature]

Nota No. 33 07/FEB/08

CON LA PRESENTE FECHA LA CONTRATISTA SE  
PRESENTA AL SITIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE  
TRAZO Y NIVELACION DE LA NUEVA RAMPA, RESPETANDO  
LO MENCIONADO EN LA NOTA ANTERIOR UNA VEZ REALI-  
ZANDO DICHOS TRABAJOS LA QUEJA DEL PREDIO No. 232  
NO PERMITE REALIZAR ACTIVIDAD ALGUNA SOBRE LA  
BANQUETA ARGUMENTANDO NUEVAMENTE QUE ES QUERA  
HASTA LA GUARNICION, Y SE CONTINUAR DEMANDARA A QUIEN  
CORRESPONDA; POR LO QUE SE LEVANTA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA  
DIDIENDO APOYO AL AREA DE JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS  
ASI COMO LA CONTRALORIA LA QUE ES MUY IMPORTANTE  
TERMINAR LA CONSTRUCCION DE RAMPAS, POR LO QUE NUEVA-  
MENTE QUERERA SUSPENDIDA HASTA RESOLVER LOS PROBLEMAS.

[Signature]

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:

[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM/DOP-SI/L.P.N./EISU-06/2006

000023  
1100023

Nota No. 34

22/MAYO/08

CON LA PRESENTE FECHA UNA VEZ QUE EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO A RESUELTO LOS PROBLEMAS CON LA DUEÑA DEL PREDIO No 232 DE LA AV. MORELOS FRENTE A LA CLINICA No 68 SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE PUEDE INICIAR CON LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA LADO ORIENTE



Nota No. 35

22/MAYO/08

CON LA PRESENTE FECHA UNA VEZ ANALIZADO LA SITUACION DE LO INTERVENCION EN LOS ACCESOS DE LOS PREDIOS SE MODIFICA A DISTRIBUCION DE LAS RAMPAS QUE DANDO DE LA SIGUIENTE FORMA



CONTINUA →

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:

[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM 1000-31 K.P.N. / FISU-06/2006 ~~000024~~  
22/MAYO/08

3er RANPA  
1er RANPA  
2da. RANPA  
MAYO 24

POR LO QUE SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE INICIE CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION A LA BREVEDAD POSIBLE




**EXPEDIENTE:** 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
**RECURRENTE:** XXXXXXXXXX  
**SUJETO OBLIGADO:** AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**PONENTE:** ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM/DDP-31/L.P.N./FISM-06/2006 - 000000


Nota No. 37 01/03/08  
22/MAR/08

CON ESTA FECHA SE HABRE ESTE LIBRO LIANADO TOMO II DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CON RAMPAS" EN AVENIDA VIA MORELOS FRENTE A LA CLINICA No. 68 DE LA COLONIA: SANTA MARIA TULPETLAC CON NO. DE CONTRATO MEM/DDP-31/L.P.N./FISM-06/2006 Y NUMERO DE OBRA: 034/2006/FISM/0027 CONTINUANDO CON EL N. DE NOTAS Y UN FOLIO NUEVO PARA ESTE TOMO.

  
 Nota # 38


  
 26/MAR/08

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION QUE SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA LA CIMENTACION

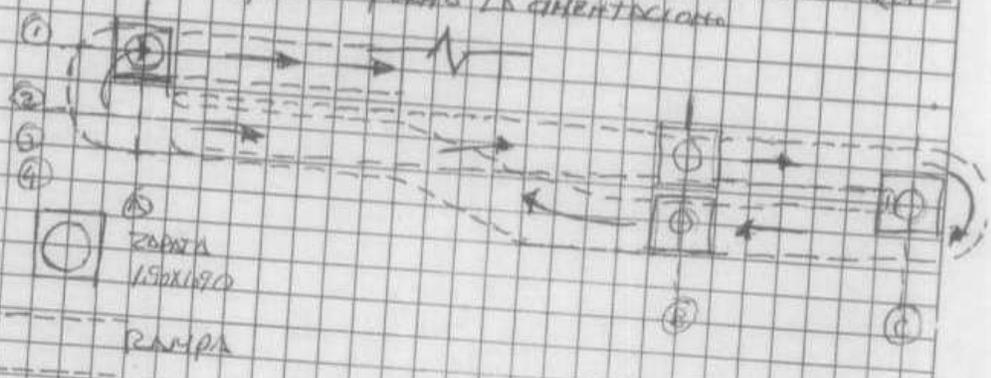

DE IGUAL FORMA SE COLOCA COMO Y CINTA PLASTICA PARA PROTECCION DEL FERTONADO.





**EXPEDIENTE:** 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
**RECURRENTE:** [REDACTED]  
**SUJETO OBLIGADO:** AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**PONENTE:** ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEX/00P-3/2.P.N./FISM-06/2006

NOTA No. 39 E00029 27/MAYO/08

CON LA PRESENTE FECHA SE INFORMA QUE SE INICIA CON LA EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II EN CIMENTACION

\* 210 \*

UNA VEZ TERMINADO LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA DE 12 CMS DE ESPESOR ASI MISMO SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE TODA LA BANQUETA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEA DEMOLIDA Y RECONSTRUIDA PARA MAYOR IMAGEN DE LA OBRA.

NOTA #40 31/MAYO/08

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA SUPERVISION Y RESIDENCIA QUE SE HA CONCLUIDO CON LA EXCAVACION ENCONTRANDO LO SIGUIENTE EN EL B/E (B-4) DUCTOS DE AGUA ASI COMO DEBAJE

CONTINUA

EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: [REDACTED]  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

#BEN/009-31/LP/M/FISM-06/2006


000000

CONTINUA NOTA #40

06/08

31/MAYO/08

DE IGUAL FORMA ENTRE LOS EJES (C-B) SE CONSTA YA QUE PASAN DUCTOS DE TELMEX EL CUAL A GARCIA TODA LA CIMENTACION PARA LO QUE SE LE PIDE A LA SUPERVISION NOS INDICAR LOS TRABAJOS A REALIZAR YA QUE SE MODIFICA LA CIMENTACION



ASI MISMO SE LE INFORMA QUE SE TENDRA QUE EXTRAER 2 PZAS DE ARXK ASI COMO SU RESPECTIVO TOLON QUE SE ENCUENTRAN EN UN HACIENDO QUE OBSTRUYE LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION Y DEMOLICION DE LA MISMA



EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:


[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

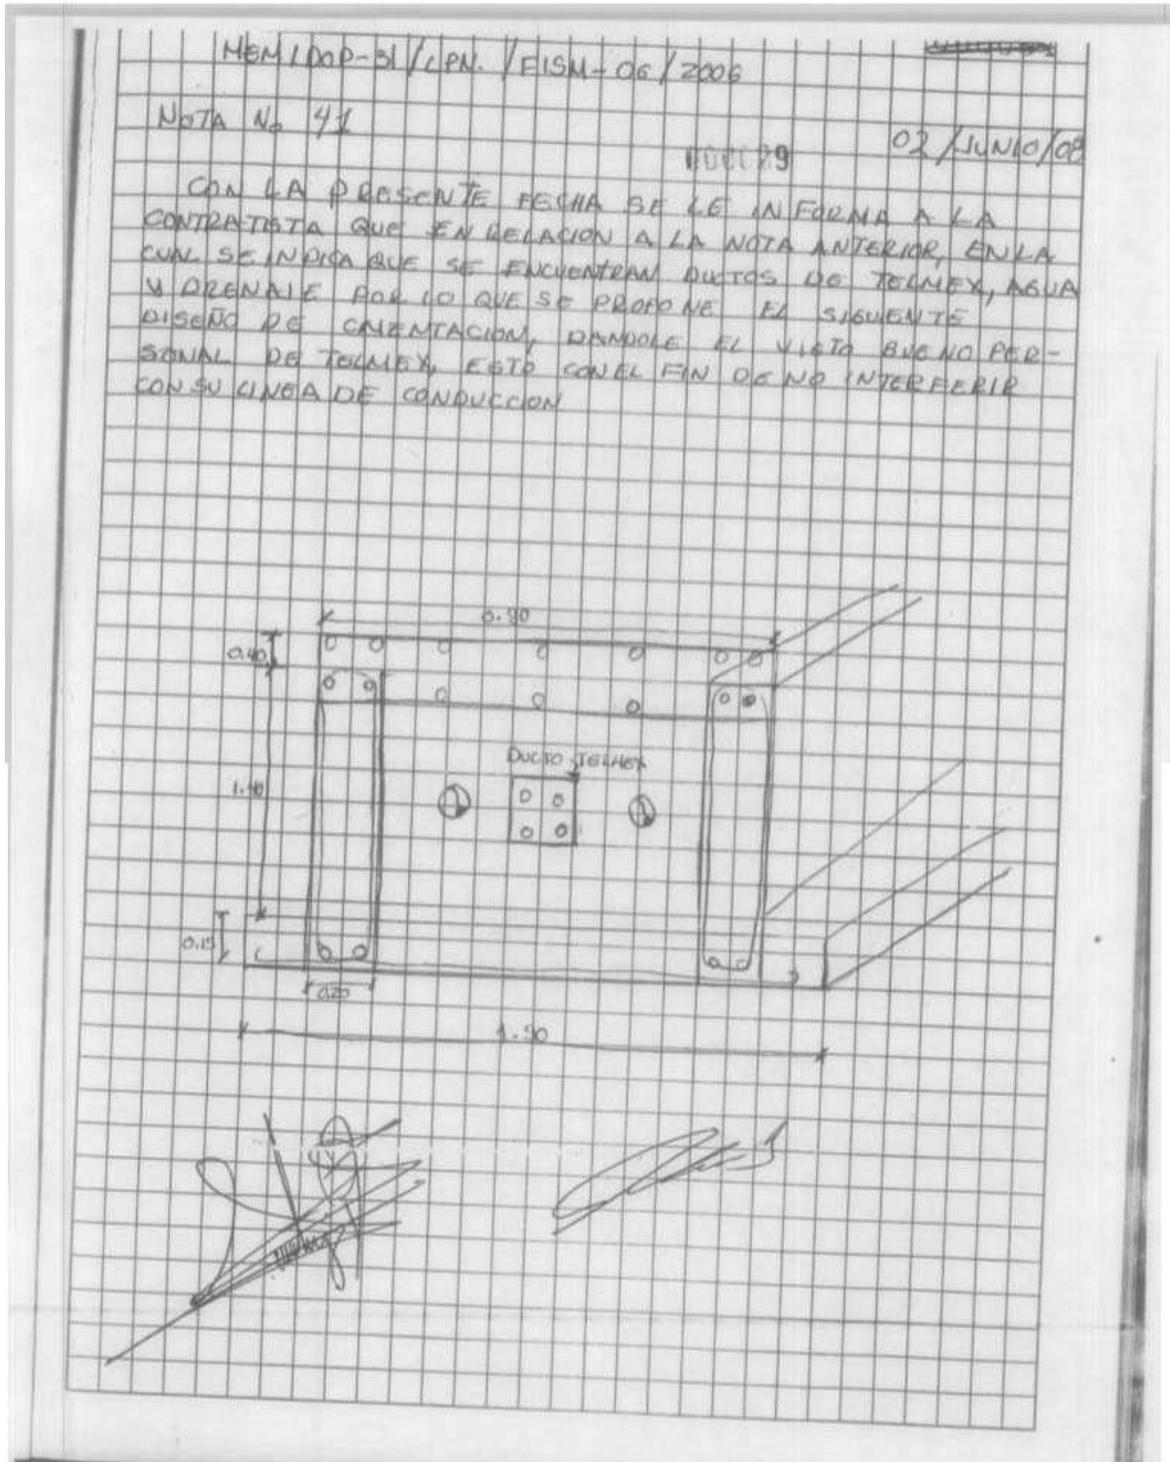

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM/DOP-31/L.P.H./FISH-06/2006


~~00045~~

Nota # 42

00030

04/JUNIO/08

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION Y RESIDENCIA QUE SE HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE PLANTILLA FC=100 kg/cm<sup>2</sup> CON UN ESPESOR DE 5CM, ASI MISMO SE INICIO CON EL HABILITADO DE ACERO BAJ CIMENTACION DEL No 3, No 4 y No 5

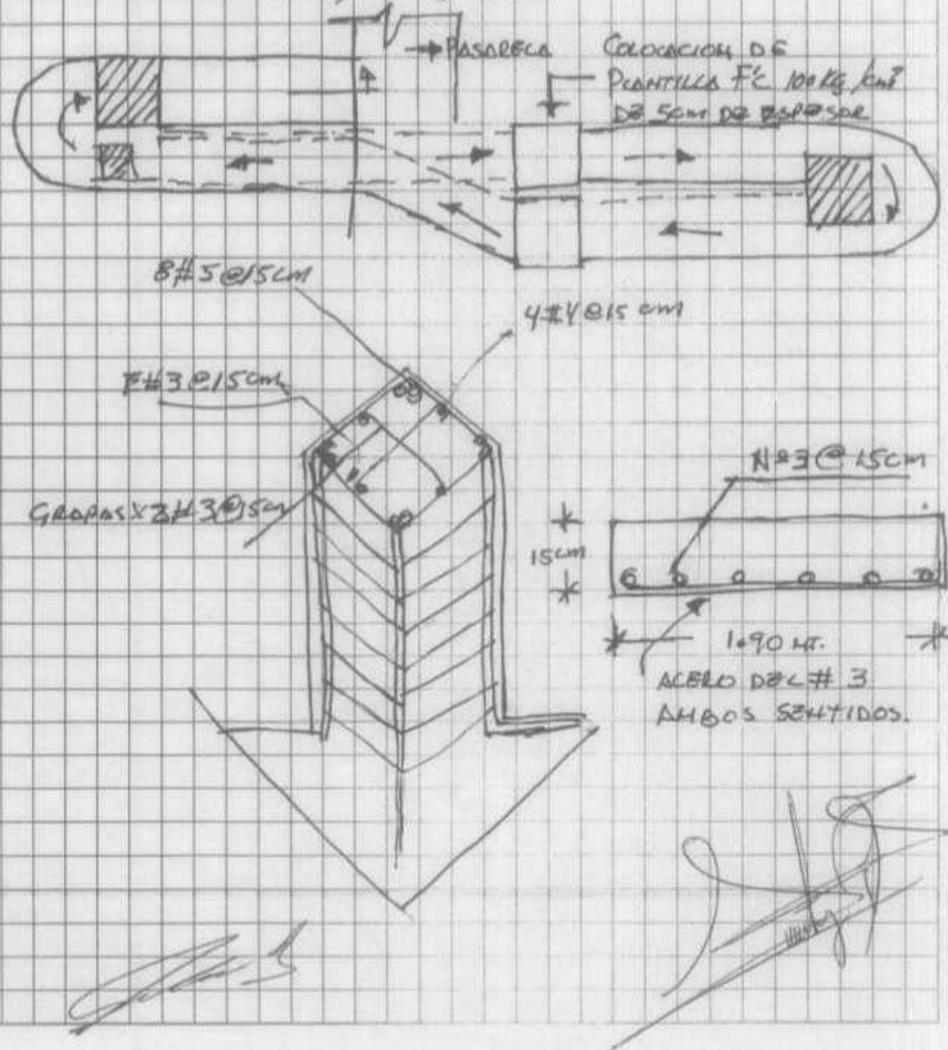

EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: XXXXXXXXXX  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM/DOP-31/L.P.W/FISM-06/2006

NOTA No 43

31

7/JUNIO/08


CON LA PRESENTE FECHA SE REALIZA UN RECORRIDO EN LA OBRA OBSERVANDO LO SIGUIENTE: SE HA CONCLUIDO CON LA COLOCACION DE PLANTILLA AL 100% SE CONTINUA CON EL HABILITADO DE ACORDO CON UN AVANCE DE 90% POR LO QUE SE LE PIDE A LA CONTRATISTA REALICE LOS TRABAJOS DE CIMBRA ACABADO COMUN EN CIMENTACION, ASI MISMO SE LE INDICA QUE AUMENTE SU FUERZA DE TRABAJO.




NOTA # 44

10/JUNIO/08

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION Y RESIDENCIA QUE SE HA CONCLUIDO EL HABILITADO DE MURO Y SE CONTINUA CON EL CIMENTADO DEL MISMO POR LO QUE SE LE PIDE PERMISO YA QUE SE PRETENDE PROGRAMAR EL CONCRETO PARA EL DIA 13 JUNIO DE 2008 COMO LO INDICA EL PLAN DE OBRAS.





EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: [REDACTED]  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE


MEM / DOP-31 / L.P.N. / EISM-06 / 2006

NOTA # 45

000032

12/JUNIO/08

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION Y RESISTENCIA QUE SE HA CONCLUIDO AL 100% EL CERRADO DE ZAPATAS Y DADOS COMO LO INDICA CATALOGO, Y LA COLOCACION DE ESPARSAOS A HOGAOS EN DADO 3/4" POR 70CM DE LARGO Y 8CM DE ROSCADO.

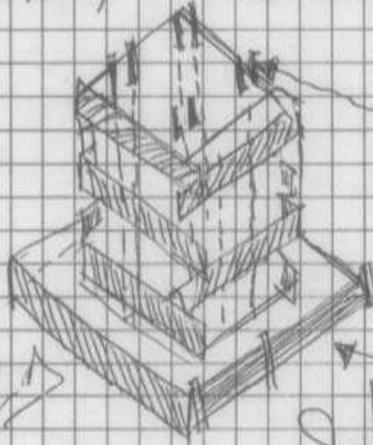

ESPARSAOS DE  
ACERO A-36 DE  
3/4"

CHISLA DE  
ZAPATA Y DADO

NOTA No 46

13/JUNIO/08

CON LA PRESENTE FECHA SE REALIZA UN RECORDADO EN LA OBRA SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE NO EXISTE INCONVENENCIA EN SUMINISTRAR EL CONCRETO HECHO EN OBRA CON  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$  CON REVENIMIENTO NORMAL, ASIMISMO SE LE INDICA QUE EMPIECE A SUMINISTRAR LA ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES LIGERO A-36 Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL (COLUMNAS, RAMPAS, BARANDAL, CANTABONES, PLACAS, ETC)

EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: [REDACTED]  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM/DOF-31/L.P.M./FISM-06/2006  
11.11.33


NOTA # 47 14/JUNIO/08

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA QUE UNA VEZ CONCLUIDO EL SUMINISTRO DE CONCRETO SE INICIA CON EL DECANBRADO Y RELLENO CON MATERIAL SANO (TRPTATE) EN CAPAS NO MAYORES DE 20CMS, ASI MISMO SE LE INFORMA QUE PARTE DEL NUDO ESTRUCTURAL SE ESTA TRABAJANDO EN TALLER, POR SEGURIDAD DEL PEATON Y NO CONTAR CON EL ESPACIO SUFICIENTE EN EL SITIO.



NOTA No 48 18/JUNIO/08

CON LA PRESENTE FECHA LA CONTRATISTA REALIZA LA COLOCACION DE COLUMNAS CON SUS RESPECTIVAS PLACAS Y CARTABONES COMO LO INDICA PROYECTO.

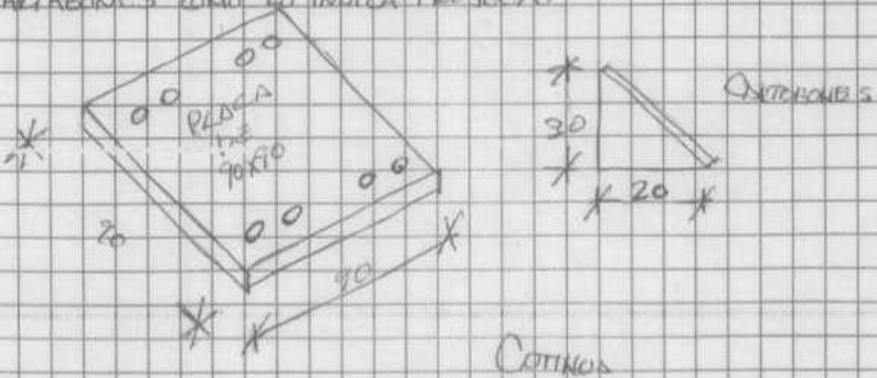

37


EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: [REDACTED]  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM / DOP-31 / L P.W. / FISM-06/2008

CONTINUA NOTA No 48

18/JUNIO/08

6.11.32

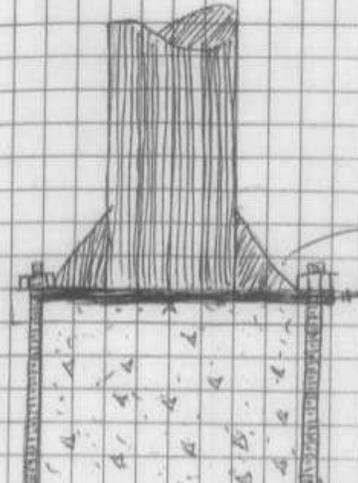

PASADIZO  
3/4 x 90 x 90 cm

CANTARERA 2030 DE 3/4\" data-bbox="420 290 760 320"/>

DE 20\" data-bbox="420 330 650 370"/>

DE 1/2\" data-bbox="420 350 500 370"/>

ESPARRAGOS DE  
ACERO A-36 DE 3/4\" data-bbox="420 380 620 420"/>

NOTA # 49

20/JUNIO/08

CON LA PRESENTE FECHA SE LE INTERHA A LA SUPERVISION QUE PARA EL PROXIMO 23 DE JUNIO DE 2008 SE MONTARAN LAS VIGAS QUE CONFORMAN LA RANPA COMO 1 PR 12\" data-bbox="170 560 750 760"/>

CONTINUA

**EXPEDIENTE:** 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
**RECURRENTE:** [REDACTED]  
**SUJETO OBLIGADO:** AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**PONENTE:** ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE


NEM/DOP-31/1.P.M./FISMOR/2006

CONTINUA NOTA # 49

000035

20/JUNIO/08


TAMBIEN SE LE INFORMA QUE PARA SEGURIDAD DEL  
 DEBEN EN LA COLOCACION DE LAS COLUMNAS ASI COMO LOS  
 IPP SE HA NECESARIO REALIZAR VARIOS MOVIMIENTOS  
 DE LA ESCALERA EXISTENTE ESTO CON EL FIN DE NO  
 DEJAR EL PUNTE SIN FUNCIONAMIENTO POR LO QUE TAM-  
 BIEN SE GENERARA UN PU EXTRAORDINARIO YA QUE EL  
 CATALOGO NO LO CONTIENE. CONJUNTAMENTE SE COLOCARA  
 EL BARRIDAL A TODO EL PERIMETRO DE LAS PUNTES.



NOTA. No 50

23/JUNIO/08

CON LA PRESENTE FECHA SE REALIZA UN RECORRIDO EN LA  
 OBRA OBSERVANDO QUE SE HA CONCLUIDO DE COLOCAR LAS  
 VIGAS QUE CONFORMAN DICHAS RAMPAS POR LO QUE SE LE  
 INDICA COLOCAR LA LOSADERO CON SUS TORNILLOS DE SUJECION  
 ASI COMO LA MALLA 6-6/10-10 PARA RESINIR CONCRETO DE P.C.  
 250 KG/CM<sup>2</sup>

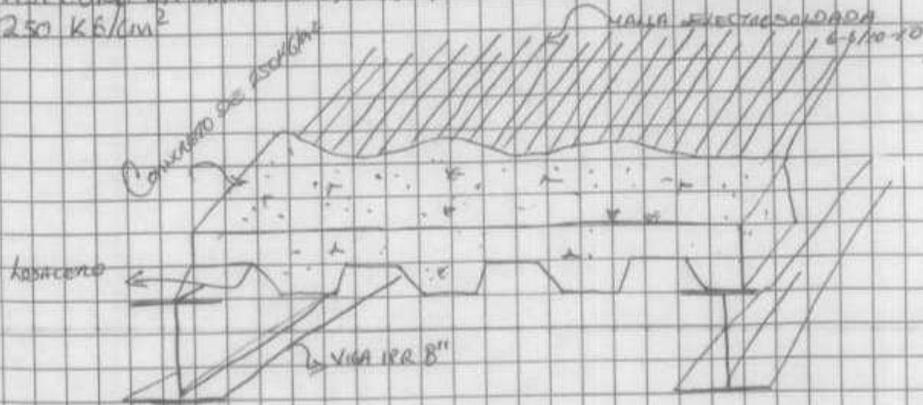

EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: XXXXXXXXXX  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

MEM/DOP-31/L.P.N./FISH-06/2008

NOTA # 51

24/JUNIO/08

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISION Y RESIDENCIA QUE PARA EL PROXIMO DIA 26 DE JUNIO DE 2008 SE COLOCARA DICHA RAMPA POR LO QUE SE LE PIDE SU VISTO BUENO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, ASI MISMO SE LE INFORMA QUE SE CONCLUYE CON LA EJECUCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

DE IGUAL FORMA SE CONSTRUIRA UN MACETERO DEBAJO DE LA PRIMER RAMPA ESTO PARA EVITAR LA ACUMULACION DE BASURA Y DARLE UNA MEJOR IMAGEN URBANA POR LO QUE SE LE HARA LLEGAR EL ANALISIS DE ESTE TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA REVISION Y PREVIA AUTORIZACION

NOTA No 52

25/JUNIO/08

CON LA PRESENTE FECHA SE LE INDICA A LA CONTRATISTA HAGA LLEGAR A ESTA SUPERVISION SUS GENERADORES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL 100% ESTO CON EL FIN DE REALIZAR LA SIGUIENTE ESTIMACION

EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: XXXXXXXXXX  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE


NEM / DOP-31 / L.P.U. / FISM-06 / 2006

NOTA # 53

MAR 37

26/JUNIO/08

CON LA PRESENTE FECHA SE LE HACE ENTREGA DE LOS GENERADORES A LA SUPERVISION PARA SU REVISION ASI MISMO REALIZADO UNA REVISION EXHAUSTIVA DEL LISTADO DE INSUMOS DE DICHA OBRA HAY ALGUNOS MATERIALES QUE HAN SUFRIDO UNA ELEVACION DE COSTO DE LA FECHA CONTRATADA HASTA EL DIA DE HOY POR LO CUI SE REALIZARA UNA ESCALATORIA DE PRECIOS PARA SU REVISION Y PREVIA AUTORIZACION.



NOTA No 54

26/JUNIO/08

CON LA PRESENTE FECHA EN RELACION A SU NOTA ANTERIOR ESTA SUPERVISION REVISARA SU PETICION Y PREVIA AUTORIZACION PARA REALIZAR SU ESCALATORIA DE PRECIOS.

DE IGUAL FORMA REVISANDO SUS GENERADORES SE OBSERVA QUE EXISTEN VOLUMENES EXCEDENTES QUE FUE NECESARIO EJECUTAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA

CONTINUA



EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE


~~000013~~

MEM/DOP-31/L.P.W/FISM-06/2006

CONTINUA NOTA No 54 6:38 26 JUNIO 08

PRELIMINARES	
TDE-516	TALA DE ARBOL
TDE-500	EXTRACCION DE TOCON
SEN-015	SEÑAL PREVENTIVA HOMBRES TRABAJANDO
CIMENTACION	
ONI-030	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL NUEVO
ALB-032	PLANTILLA DE SCLIS
ACE-009	ACERO DE REFUERZO DEL No 3
ACE-010	ACERO DE REFUERZO DEL No 4
ACE-011	ACERO DE REFUERZO DEL No 5
CON-007	CONCRETO DE 250 KG/CM <sup>2</sup> HECHO EN OBRA
ALB-313	FIRME DE 10CMS DE ESPESOR
ESTRUCTURA	
ACE-103	FABRICACION DE ESTRUCTURA A-36
ACE-103	ESPARRAGOS DE 3/4"
LIMPIEZA	
LCH-004	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

Por lo que se le indica en vie via oficio la  
PETICION DE ESTOS VOLUMENES EXCEDENTES PARA SU  
AUTORIZACION.




EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: [REDACTED]  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

UEN/DOR-31/L.P.N./FISM-06/2006

Nota No. 55

60039 28/Noviembre

CON LA PRESENTE FICHA SE HA CONCORDADO EL SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO BOMBABLE EN LA BANCA DE ACCESO POR LO QUE SE LE INDICA A LA CONTRATISTA HACER CON LOS TRABAJOS DE PINTURA DE ESMALTE CON LOS COLORES YA INDICADOS; LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETA ASI COMO ES NECESARIO LA COLOCACION DE UNAS REVILLAS DE PISO, Y LA CONSTRUCCION DE VARRINERA DONDE SE SEPARARAN ARBOLES ASI COMO ARRAYADO.

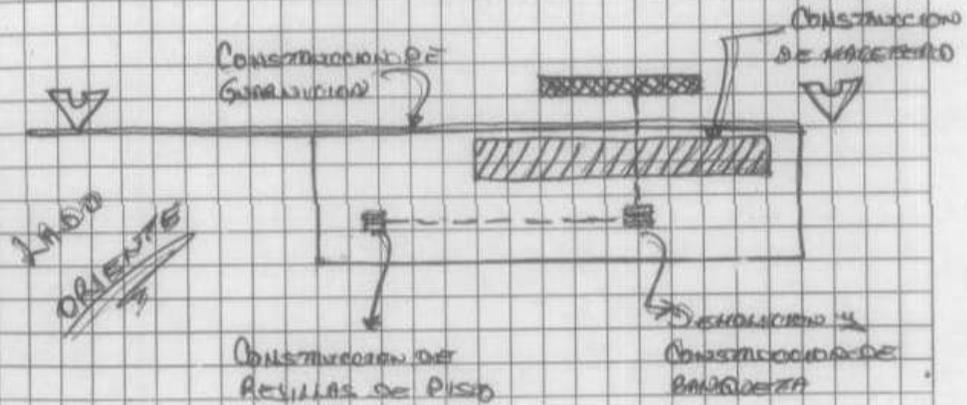

[Handwritten signatures and scribbles]

EXPEDIENTE: 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
RECURRENTE: [REDACTED]  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
PONENTE: ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

00040

Men/DCP-31/K.P.N. FISH-06/2006

Nota No. 56 11/06/08 30/JUNIO/08

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN QUE SE HA CONCLUIDO TODA LA PINTURA EN EL PUENTE ASÍ MISMO SE CONTINUARÁ CON LOS TRABAJOS RECOMENDADOS CON EL FIN DE DARLE UNA MEJOR IMAGEN EN DEDE DE LOS TRABAJOS.


 

Nota No. 57 08/JUNIO/08

CON LA PRESENTE FECHA SE REALIZA UN RECORRIDO EN LA OBRA OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

- \* SE HA CONCLUIDO LA PINTURA EN EL PUENTE.
- \* LAS GUARDACIONES Y BANQUETAS SE AAN CONCLUIDO, QUEDANDO PENDIENTE LA COLOCACION DE LA RESINAS Y LA CONCLUSION DEL HACETERO.

POR LO TANTO SE LE ADICA EN VICE A ESTA SUPERVISION SUS GONERACIONES PARA SU REVISION Y CONCILIA CION.

EXPEDIENTE:

00040/INFOEM/IP/RR/2011

RECURRENTE:

[REDACTED]

SUJETO OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS

PONENTE:

ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

Mem/SOP-31 L.P.H. FISH-06/2006


~~000016~~

Nota No. 58

Pág. 41

03/JUNIO/08

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN LA RESIDENCIA QUE SE HAN CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS. POR LO QUE SE INICIA CON LA AMPLEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU PROXIMA ENTREGA RECEPCION.




Nota No. 59

04/JUNIO/08

CON LA PRESENTE FECHA SE REALIZA UN RECORRIDO EN LA OBRA OBSERVANDO QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA CONCLUIDOS AL 100% ASI MISMO FUE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA EL BUEN PORCIONAMIENTO DE LA OBRA A NOMBRE EN LISTAS ADICIONALES CONTINUACION.

- \* DEMOLICION DE JARDINERA
- \* CONSTRUCCION DE REGISTRO CON RENILLA
- \* CONSTRUCCION DE SENTELON
- \* SUMINISTRO DE ARGUSTO ARRILLAN
- \* SUMINISTRO DE ARGUSTO FICUS
- \* CONSTRUCCION DE JARDINERA
- \* MOVIMIENTO DE ESCALERA

CON LO TANTO SE LE SOLICITA EN VIE VIA OFICIO DICHOS PRECIOS PARA SU REVISION Y PREVIA AUTORIZACION.





**EXPEDIENTE:** 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
**RECURRENTE:** [REDACTED]  
**SUJETO OBLIGADO:** AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**PONENTE:** ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE



De lo que se colige que, el archivo electrónico adjuntado al Informe Justificado que rindió **EL SUJETO OBLIGADO**, satisface el requerimiento de **EL RECURRENTE**, en cuanto a la copia de la bitácora relacionada con la "Construcción del Puente Peatonal con Rampas en Avenida Vía Morelos, frente a la Clínica No. 68", que fue el objeto del Contrato de Obra Pública sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado **MEM/DOP-31/LPN/FISM-06/2006**; lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 75 Bis A, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, conlleva al sobreseimiento de este recurso de revisión.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 60 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; este Órgano Garante del derecho de acceso a la información

### **RESUELVE**

**PRIMERO.** Por las disertaciones vertidas en el considerando **II** de esta resolución, se declara el **sobreseimiento** del recurso de revisión identificado con el número de expediente **00040/INFOEM/IP/RR/2011**.

**EXPEDIENTE:** 00040/INFOEM/IP/RR/2011  
**RECURRENTE:** [REDACTED]  
**SUJETO OBLIGADO:** AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS  
**PONENTE:** ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

**SEGUNDO.** Se hace del conocimiento a **EL RECURRENTE**, que en caso de considerar que la presente resolución le causa algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo de acuerdo a lo estipulado por el artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios.

**TERCERO.** Notifíquese a **EL RECURRENTE**, y remítase a la Unidad de Información del **SUJETO OBLIGADO**, vía **EL SICOSIEM**, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

ASÍ LO RESUELVE POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE.- CON EL VOTO A FAVOR DE ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV, PRESIDENTE, MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ, COMISIONADA, MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN, COMISIONADA, FEDERICO GUZMÁN TAMAYO, COMISIONADO AUSENTE EN LA VOTACION Y ARCADIO ALBERTO SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE, COMISIONADO, SIENDO PONENTE EL ÚLTIMO DE LOS NOMBRADOS; ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO IOVJAYI GARRIDO CANABAL PÉREZ.

**EL PLENO  
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL  
ESTADO DE MÉXICO.**

**ROSENDOEVGUENI MONTERREY  
CHEPOV  
PRESIDENTE**

**MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ  
COMISIONADA**

**MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN  
COMISIONADA**

**AUSENTE EN LA VOTACION  
FEDERICO GUZMÁN TAMAYO  
COMISIONADO**

**ARCADIO A. SÁNCHEZ HENKEL  
GÓMEZTAGLE  
COMISIONADO**

**IOVJAYI GARRIDO CANABAL PÉREZ  
SECRETARIO TÉCNICO**

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE, EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE **00040/INFOEM/IP/RR/2011**.
